


位置図



被災状況写真(令和3年5月撮影)

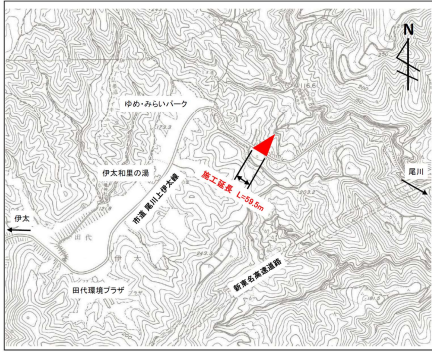

進捗状況写真(令和4年6月撮影)



計画工程表

	令和3年度						令和4年度															
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
当初	●	●	→																		●	
	入札・仮契約	本契約																			当初工期 10月末	
			→ 鋼管杭工																			
変更	●	●	→																		●	
	入札・仮契約	本契約																			変更工期 3月中旬	
			→ 鋼管杭工																			

標準断面図

