

平成25年度 島田市環境課 空間線量率測定結果

施設名：島田市田代環境プラザ

測定機関：株式会社 静環検査センター

測定方法：放射能濃度等測定方法ガイドライン 平成25年3月 第2版（環境省）


測定機器：Hitachi Aloka Medical TCS-172B シンチレーションサーベイメーターNaI(Tl)

敷地境界

単位：μSv/h

測定場所	地面の状態	地面からの高さ	4月10日	5月22日	6月19日	7月24日	8月21日	9月18日	10月9日	11月20日	12月18日	1月22日	2月19日	3月12日
東側	コンクリート	1m	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.05	0.08	0.08	0.07	0.07
		5cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08
南側	アスファルト	1m	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08
		5cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.06	0.09	0.07	0.08	0.08
西側	土	1m	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.05	0.08	0.07	0.08	0.07
		5cm	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08	0.09
北側	アスファルト	1m	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.08	0.06	0.07	0.07
		5cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.08

備考：測定結果は、5回測定した平均値を示す。

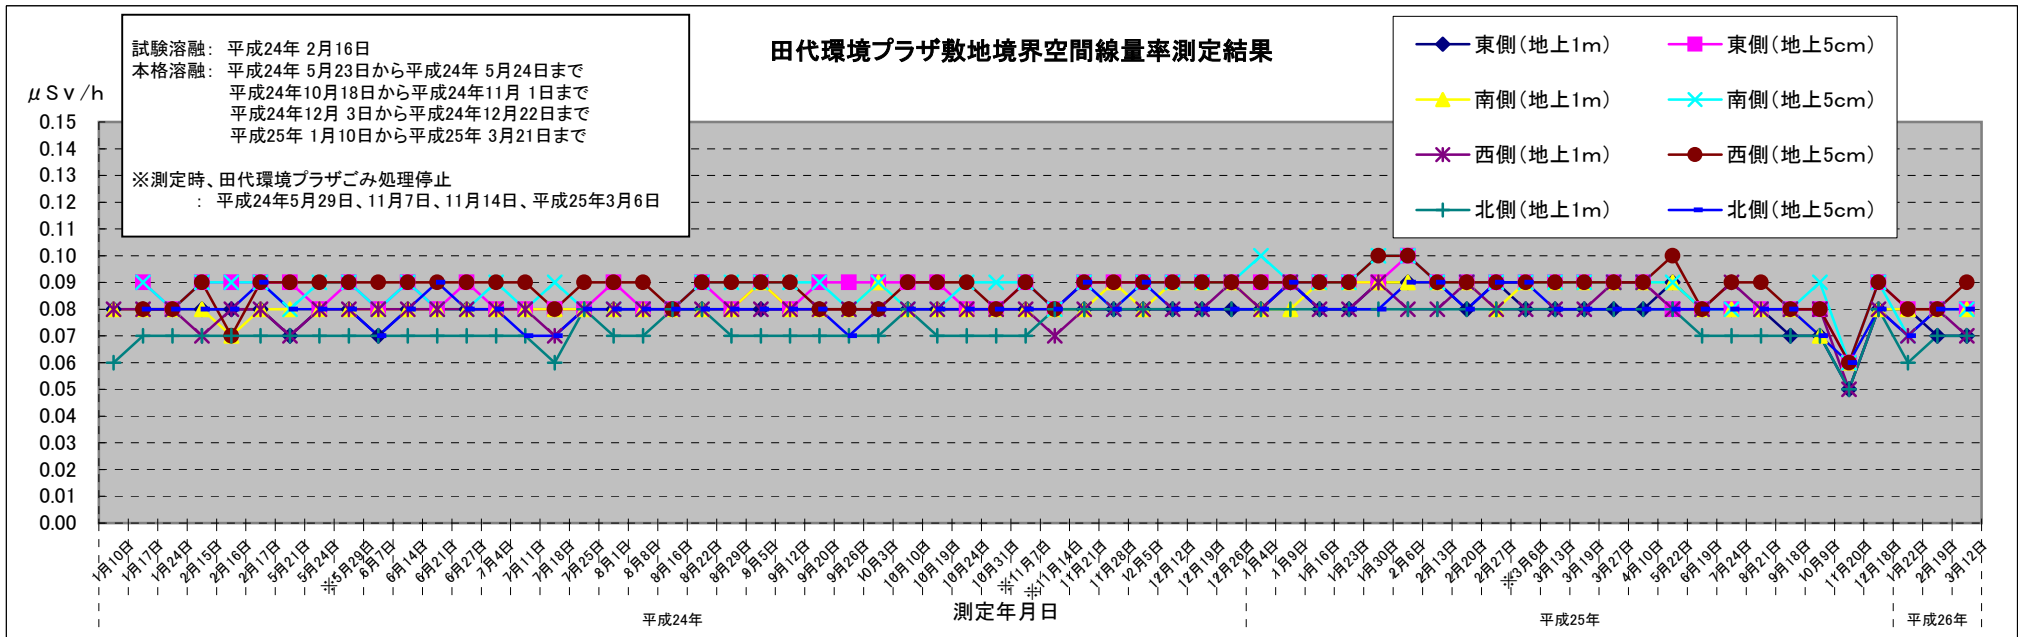


小学校

単位:  $\mu\text{Sv/h}$

測定場所	地面の状態	地面からの高さ	4月10日	5月22日	6月19日	7月24日	8月21日	9月18日	10月9日	11月20日	12月18日	1月22日	2月19日	3月12日	
島田市立伊太小学校正門	コンクリート	1m	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.05	0.08	0.06	0.07	0.07	
		50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07
		5cm	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.06	0.05	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
島田市立伊太小学校グラウンド中央	土	1m	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
		50cm	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.05	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06
		5cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.05	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07
島田市立大津小学校正門	コンクリート	1m	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
		50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.07	0.07	0.07	0.07
		5cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.08	0.07	0.07	0.07
島田市立大津小学校グラウンド中央	土	1m	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
		50cm	0.06	0.06	0.05	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05
		5cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.06	0.05

備考 : 測定結果は、5回測定した平均値を示す。

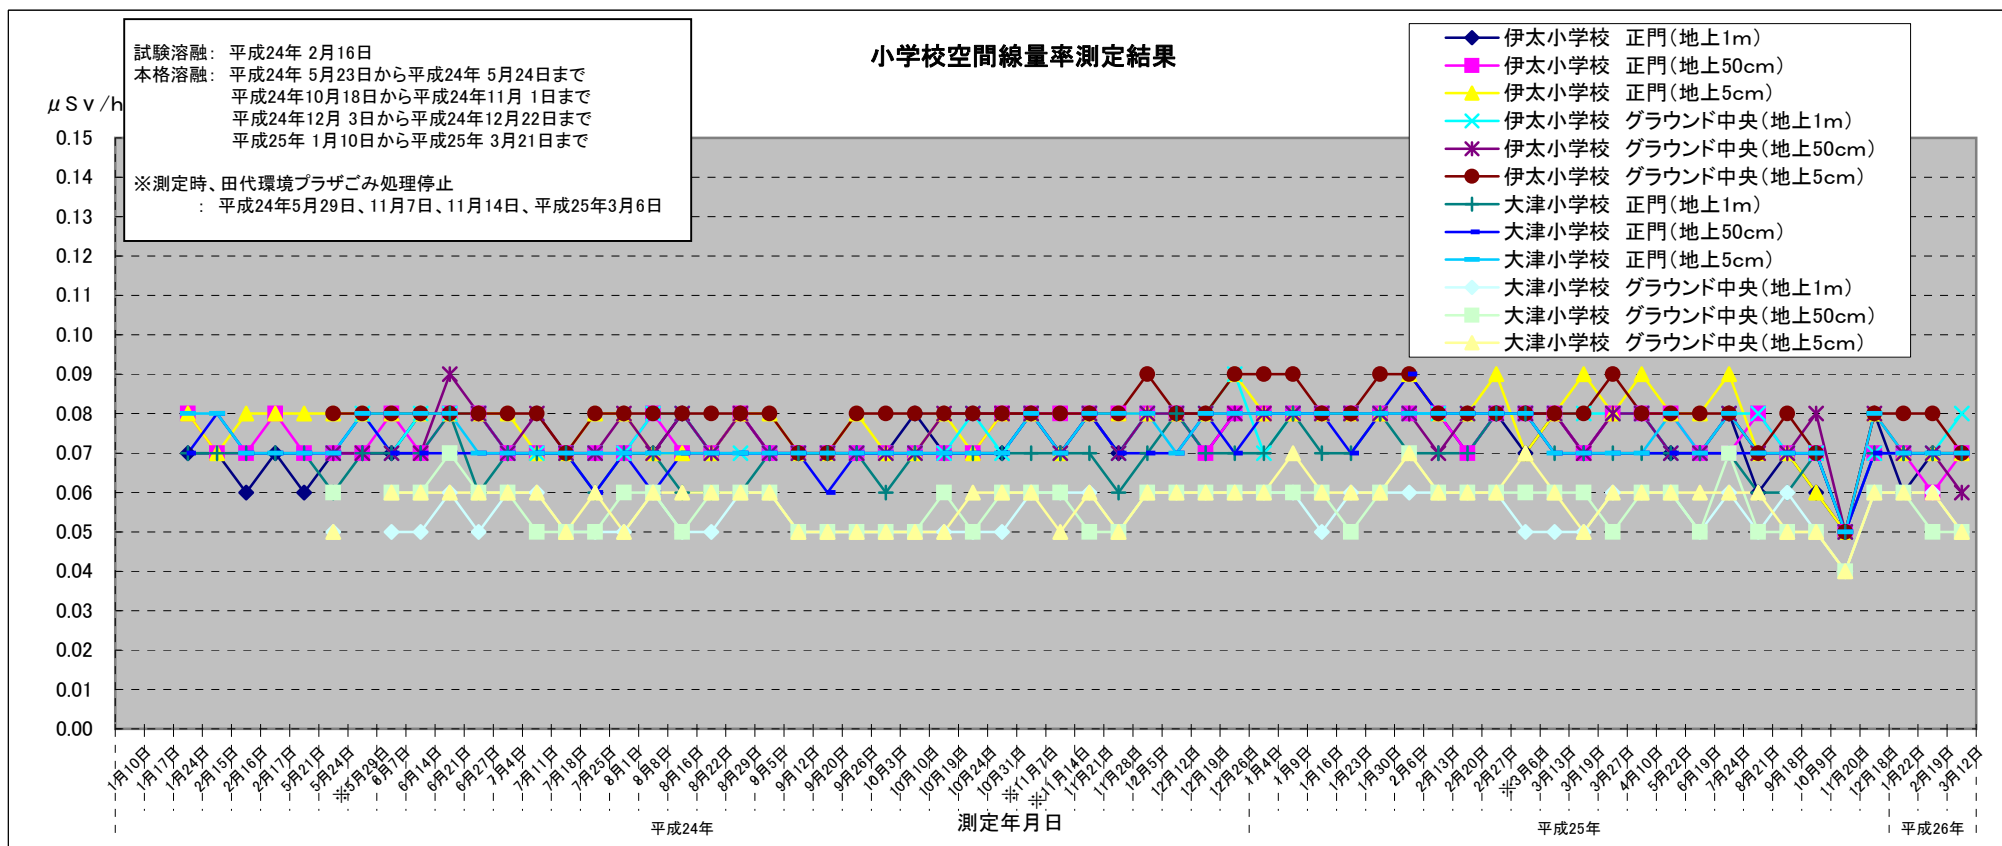

敷地外

単位:  $\mu\text{Sv/h}$

測定場所	地面の状態	地面からの高さ	4月10日	5月22日	6月19日	7月24日	8月21日	9月18日	10月9日	11月20日	12月18日	1月22日	2月19日	3月12日
上伊太公会堂	アスファルト	1m	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.06	0.08	0.05	0.08	0.07	0.08	0.08
老人福祉センター伊太なごみの里南側	土	1m	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.08	0.08	0.07	0.08

その他

単位:  $\mu\text{Sv/h}$

測定場所	地面の状態	地面からの高さ	4月10日	5月22日	6月19日	7月24日	8月21日	9月18日	10月9日	11月20日	12月18日	1月22日	2月19日	3月12日
バックグラウンド候補地①	土	1m	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.08	0.07	0.07	0.07
バックグラウンド候補地②	土	1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.08	0.05	0.09	0.07	0.07	0.07
バックグラウンド候補地③	土	1m	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.05	0.08	0.07	0.08	0.07

備考 : 測定結果は、5回測定した平均値を示す。

